


Max Musterman
 Musterstrasse 4
 12345 Musterhausen

Dichtheitsprüfung nach DWA 139 (Verfahren Luft)

Auftraggeber:	MesSen Nord GmbH		
Straße:	Zum Forsthof 2		
Ort:	18198 Stäbelow	Telefon:	038207 656 0
Bauvorhaben:	Luftprüfung		
Prüfabschnitt:			
Straße:			
Ort:			
Prüfobjekt:	Testobjekt	nach Schacht:	
von Schacht:			
Abschnitt:	Abschnitt 1		
Material:	Beton trocken		
Querschnitt:	Kreis		
Abmaß:	100 mm		
Länge:	0.10 m		
Prüfzeitberechnung:	prüfzeit = 0.015 * DN		
Prüfverfahren:	Rohrleitungsprüfung	Prüfdruck:	100.0 mbar
Prüfzeit:	1.5 min	Zulässiger Druckabfall:	15.0 mbar
Beginn Füllen:	19.08.2010 11:55:47	bei Druckwert:	0.0 mbar
Beginn Prüfung:	19.08.2010 11:56:16	bei Druckwert:	101.0 mbar
Prüfungsende nach:	1.5 min	Druckabfall:	0.2 mbar
Prüfresultat:	Prüfung bestanden		
Prüfer:	Max Mustermann	Prüfgerät ROHRTEST, SN:	MPG 20919
Bemerkung:			
Protokolldatei:	100819115547.DAT		

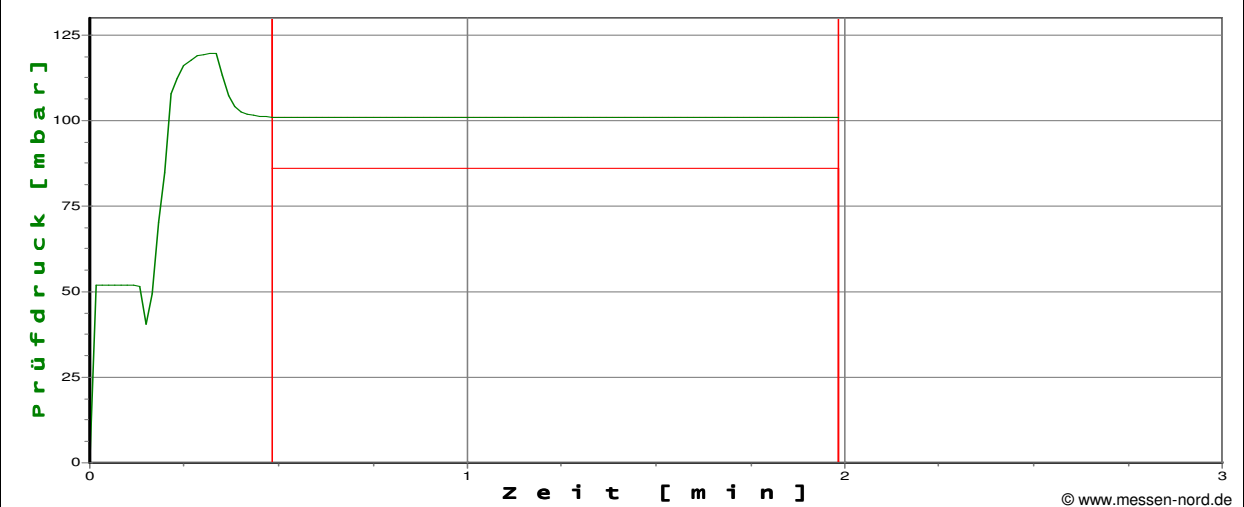

Datum **Prüfer** **Auftraggeber**
