


Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 (Verfahren Luft)

Auftraggeber:	Firma Mustermann	Telefon:	
Straße:	Musterstrasse 1		
Ort:	12345 Musterstadt		
Bauvorhaben:	Erschliessung Gewerbegebiet		
Prüfobjekt:	Musterhaltung		
Straße:			
Ort:			
Prüfabschnitt:			
von Schacht:			
nach Schacht:			
Info:			
Haltung:	Kanal Straßenunterführung		
Material:	Steinzeug		
Querschnitt:	Kreis		
Abmaße:	150 mm		
Länge:	25.00 m		
Prüfverfahren:	Rohrleitungsprüfung	Prüfdruck:	100.0 mbar
Prüfzeit:	3.0 min	zul. Druckabfall:	15.0 mbar
Beginn Füllen:	15.02.2015 11:59:51	bei Druckwert:	19.2 mbar
Beginn Prüfung:	15.02.2015 12:03:38	bei Druckwert:	100.9 mbar
Prüfungsende nach:	3.0 min	Druckabfall:	0.3 mbar
Prüfresultat:	Prüfung bestanden		
Prüfer:		Prüfgerät ROHRTEST:	RT4 #000000
		Drucksensor:	
Bemerkung:			
Protokolldatei:	070215115951.DAT		

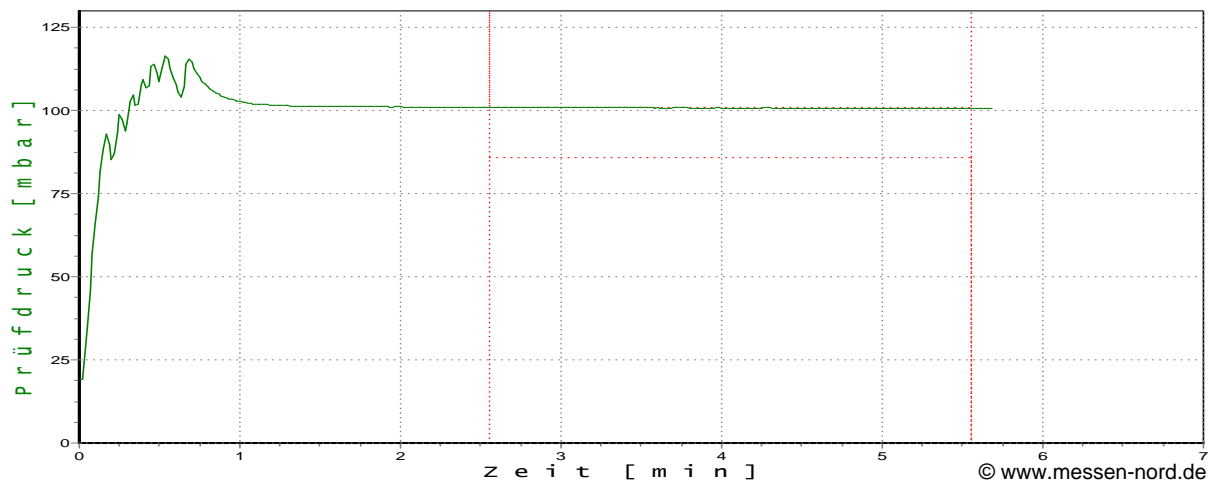

Prüfdatum

Prüfer

Auftraggeber
