




## Schacht-Dichtheitsprüfung nach ATV-M 143-6 (Vakuum)

|                           |                          |                            |              |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>Auftraggeber:</b>      | MesSen Nord GmbH         | <b>Telefon:</b>            | 038207 656 0 |
| <b>Straße:</b>            | Zum Forsthof 2           |                            |              |
| <b>Ort:</b>               | 18198 Stäbelow           |                            |              |
| <b>Bauvorhaben:</b>       | Schacht (V)              |                            |              |
| <b>Prüfobjekt:</b>        | 462003020                |                            |              |
| <b>Straße:</b>            | Hauptstrasse             |                            |              |
| <b>Ort:</b>               | Stäbelow                 |                            |              |
| <b>Prüfabschnitt:</b>     | Testabschnitt            |                            |              |
| <b>von Schacht:</b>       | 3                        |                            |              |
| <b>nach Schacht:</b>      | 4                        |                            |              |
| <b>Haltung:</b>           | 1                        |                            |              |
| <b>Material:</b>          | Beton                    |                            |              |
| <b>Querschnitt:</b>       | Kreis                    |                            |              |
| <b>Abmaße:</b>            | 1000 mm                  |                            |              |
| <b>Länge:</b>             | 2.90 m                   |                            |              |
| <b>Prüfverfahren:</b>     | Schachtprüfung           | <b>Prüfdruck:</b>          | -100.0 mbar  |
| <b>Prüfzeit:</b>          | 10.0 min                 | <b>zul. Druckanstieg:</b>  | 12.0 mbar    |
| <b>Beginn Füllen:</b>     | 28.09.2006 11:39:41      | <b>bei Druckwert:</b>      | -78.0 mbar   |
| <b>Beginn Prüfung:</b>    | 28.09.2006 11:50:44      | <b>bei Druckwert:</b>      | -105.6 mbar  |
| <b>Prüfungsende nach:</b> | 10.0 min                 | <b>Druckanstieg:</b>       | 4.8 mbar     |
| <b>Prüfresultat:</b>      | <b>Prüfung bestanden</b> |                            |              |
| <b>Prüfer:</b>            | Max Tester               | <b>Prüfgerät ROHRTEST:</b> | RT4 #123456  |
| <b>Bemerkung:</b>         |                          |                            |              |
| <b>Protokolldatei:</b>    | 060928113941.DAT         |                            |              |

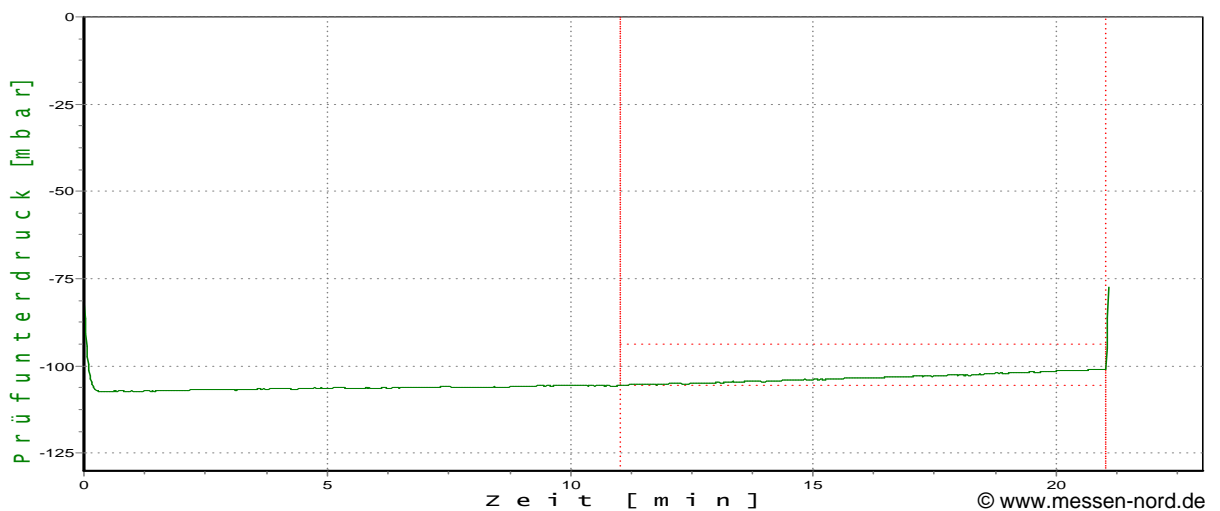

Prüfdatum: 28.09.2006    Prüfer: *Max Tester*    Auftraggeber: .....
